

校園安全檢核表

學校名稱：臺南市關廟區深坑國民小學

檢核日期：110年8月10日

項次	項目	安全檢核應注意要點	查核結果	建議處置方式
1	一般事項	校舍興建、修繕時，應設置安全圍籬及警告標示以維安全	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	
2.		確實執行各項公共設施定期檢查、保養、維護	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	
4		逃生與疏散路線是否堆積雜物影響通行	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是	
5		危險物品儲放及管理是否符合安全	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	
6		電源線路開關是否有裸露及不正常使用狀況	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是	
			各類門鎖是否故障損壞，電動門（鐵捲門）啟動時是否有警示管理	<input checked="" type="checkbox"/> 否：各類門鎖無故障損壞 <input checked="" type="checkbox"/> 是：電動門（鐵捲門）啟動時有警示管理
7	消防設備	警報及照明設施是否正常良好	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	
8		滅火器及消防箱（栓）相關設備是否正常良好	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	
9	校舍建物外觀	是否移位、傾斜、下陷	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是（拍照存查，建議專業人員訪視處理）	
		外牆磁磚（混凝土）是否剝落或有滲漏水現象	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是（限期改善）	
10	伸縮縫或建築物間隔	寬度是否明顯改變	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是，寬度變小或碰撞，裝修材脫落（拍照存查，建議專業人員訪視處理） <input type="checkbox"/> 是，寬度變大，伸縮縫脫離（拍照存查，建議專業人員訪視處理）	
11	地下室	樑、樓版、牆壁是否有滲漏水現象	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是（限期改善）	
12	樑柱、牆壁、樓地板（含一樓地板）	是否有裂縫	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是，既有裂縫加長加寬（拍照存查並註明裂縫變化情形） <input type="checkbox"/> 是，但裂縫寬度小於0.4公厘（建議持續檢視） <input type="checkbox"/> 是，且裂縫寬度大於0.4公厘（拍照存查並註明裂縫寬度，建議專業人員訪視處理）	
		混凝土保護層是否剝落	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是，但無磚塊或鋼筋外露（建議修復） <input type="checkbox"/> 是，且有磚塊或鋼筋外露（拍照存查，建議專業人員訪視處理）	
		是否有傾斜或穿透性開裂	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是（拍照存查，建議專業人員訪視處理）	

13	屋頂	屋頂通道門是否變形	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是(限期改善)	
		屋頂防水層表面是否損壞(如長雜草等)	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是(限期改善)	
		排水管道是否通暢	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否(限期改善)	
		女兒牆是否損壞	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是(限期改善)	
		水塔是否有裂縫	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是, 但裂縫寬度小於 0.4 公厘(建議修復) <input type="checkbox"/> 是, 且裂縫寬度大於 0.4 公厘(拍照存查並註明裂縫寬度, 建議專業人員訪視處理)	
		水塔固定設施是否鬆脫	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是(限期改善)	
14	建物 附屬 設備	室內懸吊物(如天花板、燈具、吊扇、影視設備等)之固定設施是否鬆脫	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是(限期改善)	
		高度 1.5 公尺以上櫥櫃是否有穩固之固定設施	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否(限期改善)	
		門窗玻璃是否變形	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是(限期改善)	
		樓梯扶手、護網與欄杆是否牢固	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否(限期改善)	
15	其他			
檢查結果 補充說明 及建議處 置、因應 作為				

※ 本自主檢查表所定檢查項目僅供參考, 各校得視個別狀況及需求自行增刪。

※ 拍照存查者須註明拍照日期、時間及位置, 並列為本表格附件。

校舍安全檢核小組	深坑國小 校長 王光宗	教師兼 教務組長 邵雅慧	教師兼附設 幼兒園主任 張玉梅
	教師兼 學務組長 郭振生	教師兼 總務主任 洪正義	深坑國小 學生家長會會長 鄭安峻
			教師兼 教導主任 張雅玲

承辦人:

教師兼
學務組長 **郭振生**

總務主任:

教師兼
總務主任 **洪正義**

校長:

深坑國小
校長 **王光宗**

校園安全檢核表

學校名稱：臺南市關廟區深坑國民小學

檢核日期：111年2月11日

項次	項目	安全檢核應注意要點	查核結果	建議處置方式
1	一般事項	校舍興建、修繕時，應設置安全圍籬及警告標示以維安全	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	
2.		確實執行各項公共設施定期檢查、保養、維護	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	
4		逃生與疏散路線是否堆積雜物影響通行	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是	
5		危險物品儲放及管理是否符合安全	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	
6		電源線路開關是否有裸露及不正常使用狀況	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是	
			各類門鎖是否故障損壞，電動門（鐵捲門）啟動時是否有警示管理	<input checked="" type="checkbox"/> 否：各類門鎖無故障損壞 <input checked="" type="checkbox"/> 是：電動門（鐵捲門）啟動時有警示管理
7	消防設備	警報及照明設施是否正常良好	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	
8		滅火器及消防箱（栓）相關設備是否正常良好	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	
9	校舍建物外觀	是否移位、傾斜、下陷	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是（拍照存查，建議專業人員訪視處理）	
		外牆磁磚（混凝土）是否剝落或有滲漏水現象	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是（限期改善）	
10	伸縮縫或建築物間隔	寬度是否明顯改變	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是，寬度變小或碰撞，裝修材脫落（拍照存查，建議專業人員訪視處理） <input type="checkbox"/> 是，寬度變大，伸縮縫脫離（拍照存查，建議專業人員訪視處理）	
11	地下室	樑、樓版、牆壁是否有滲漏水現象	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是（限期改善）	
12	樑柱、牆壁、樓地版（含一樓地版）	是否有裂縫	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是，既有裂縫加長加寬（拍照存查並註明裂縫變化情形） <input type="checkbox"/> 是，但裂縫寬度小於0.4公厘（建議持續檢視） <input type="checkbox"/> 是，且裂縫寬度大於0.4公厘（拍照存查並註明裂縫寬度，建議專業人員訪視處理）	
		混凝土保護層是否剝落	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是，但無磚塊或鋼筋外露（建議修復） <input type="checkbox"/> 是，且有磚塊或鋼筋外露（拍照存查，建議專業人員訪視處理）	
		是否有傾斜或穿透性開裂	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是（拍照存查，建議專業人員訪視處理）	

13	屋頂	屋頂通道門是否變形	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是(限期改善)	
		屋頂防水層表面是否損壞(如長雜草等)	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是(限期改善)	
		排水管道是否通暢	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否(限期改善)	
		女兒牆是否損壞	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是(限期改善)	
		水塔是否有裂縫	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是, 但裂縫寬度小於 0.4 公厘(建議修復) <input type="checkbox"/> 是, 且裂縫寬度大於 0.4 公厘(拍照存查並註明裂縫寬度, 建議專業人員訪視處理)	
		水塔固定設施是否鬆脫	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是(限期改善)	
14	建物 附屬 設備	室內懸吊物(如天花板、燈具、吊扇、影視設備等)之固定設施是否鬆脫	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是(限期改善)	
		高度 1.5 公尺以上櫥櫃是否有穩固之固定設施	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否(限期改善)	
		門窗玻璃是否變形	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是(限期改善)	
		樓梯扶手、護網與欄杆是否牢固	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否(限期改善)	
15	其他			
檢查結果 補充說明 及建議處 置、因應 作為				

※ 本自主檢查表所定檢查項目僅供參考, 各校得視個別狀況及需求自行增刪。

※ 拍照存查者須註明拍照日期、時間及位置, 並列為本表格附件。

校舍安全檢核小組	<input checked="" type="checkbox"/> 鄭女峻 <input checked="" type="checkbox"/> 張玉梅 <input checked="" type="checkbox"/> 郭振生 <input checked="" type="checkbox"/> 張雅玲 <input checked="" type="checkbox"/> 邵雅慧 <input checked="" type="checkbox"/> 洪正義
----------	--

承辦人：

郭振生
教師兼學務組長

總務主任：

洪正義
教師兼總務主任

校長：

王光宗
深坑國小校長

校園安全檢核表

學校名稱：臺南市關廟區深坑國民小學

檢核日期：111年8月23日

項次	項目	安全檢核應注意要點	查核結果	建議處置方式
1	一般事項	校舍興建、修繕時，應設置安全圍籬及警告標示以維安全	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	
2.		確實執行各項公共設施定期檢查、保養、維護	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	
4		逃生與疏散路線是否堆積雜物影響通行	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是	
5		危險物品儲放及管理是否符合安全	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	
6		電源線路開關是否有裸露及不正常使用狀況	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是	
		各類門鎖是否故障損壞，電動門（鐵捲門）啟動時是否有警示管理	<input checked="" type="checkbox"/> 否：各類門鎖無故障損壞 <input checked="" type="checkbox"/> 是：電動門（鐵捲門）啟動時有警示管理	
7	消防設備	警報及照明設施是否正常良好	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	
8		滅火器及消防箱（栓）相關設備是否正常良好	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	
9	校舍建物外觀	是否移位、傾斜、下陷	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是（拍照存查，建議專業人員訪視處理）	
		外牆磁磚（混凝土）是否剝落或有滲漏水現象	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是（限期改善）	
10	伸縮縫或建築物間隔	寬度是否明顯改變	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是，寬度變小或碰撞，裝修材脫落（拍照存查，建議專業人員訪視處理） <input type="checkbox"/> 是，寬度變大，伸縮縫脫離（拍照存查，建議專業人員訪視處理）	
11	地下室	樑、樓版、牆壁是否有滲漏水現象	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是（限期改善）	
12	樑柱、牆壁、樓地板（含一樓地板）	是否有裂縫	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是，既有裂縫加長加寬（拍照存查並註明裂縫變化情形） <input type="checkbox"/> 是，但裂縫寬度小於0.4公厘（建議持續檢視） <input type="checkbox"/> 是，且裂縫寬度大於0.4公厘（拍照存查並註明裂縫寬度，建議專業人員訪視處理）	
		混凝土保護層是否剝落	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是，但無磚塊或鋼筋外露（建議修復） <input type="checkbox"/> 是，且有磚塊或鋼筋外露（拍照存查，建議專業人員訪視處理）	
		是否有傾斜或穿透性開裂	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是（拍照存查，建議專業人員訪視處理）	

13	屋頂	屋頂通道門是否變形	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是(限期改善)	
		屋頂防水層表面是否損壞(如長雜草等)	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是(限期改善)	
		排水管道是否通暢	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否(限期改善)	
		女兒牆是否損壞	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是(限期改善)	
		水塔是否有裂縫	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是, 但裂縫寬度小於 0.4 公厘(建議修復) <input type="checkbox"/> 是, 且裂縫寬度大於 0.4 公厘(拍照存查並註明裂縫寬度, 建議專業人員訪視處理)	
		水塔固定設施是否鬆脫	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是(限期改善)	
14	建物附屬設備	室內懸吊物(如天花板、燈具、吊扇、影視設備等)之固定設施是否鬆脫	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是(限期改善)	
		高度 1.5 公尺以上櫥櫃是否有穩固之固定設施	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否(限期改善)	
		門窗玻璃是否變形	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是(限期改善)	
		樓梯扶手、護網與欄杆是否牢固	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否(限期改善)	
15	其他			
檢查結果補充說明及建議處置、因應作為				

※ 本自主檢查表所定檢查項目僅供參考, 各校得視個別狀況及需求自行增刪。

※ 拍照存查者須註明拍照日期、時間及位置, 並列為本表格附件。

校舍安全檢核小組	教師兼總務主任 洪正義	教師兼學務組長 劉旺菁	教師兼教導主任 張雅玲	深坑國小學生家長會會長 鄭安峻
	教師兼學務組長 邵雅慧	教師兼附設幼兒園主任 張玉梅	深坑國小校長 王光宗	
承辦人:	教師兼學務組長 劉旺菁	總務主任:	教師兼總務主任 洪正義	校長:
			深坑國小校長 王光宗	

校園安全檢核表

學校名稱：臺南市關廟區深坑國民小學

檢核日期：112年2月8日

項次	項目	安全檢核應注意要點	查核結果	建議處置方式
1	一般事項	校舍興建、修繕時，應設置安全圍籬及警告標示以維安全	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	
2.		確實執行各項公共設施定期檢查、保養、維護	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	
4		逃生與疏散路線是否堆積雜物影響通行	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是	
5		危險物品儲放及管理是否符合安全	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	
6		電源線路開關是否有裸露及不正常使用狀況	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是	
		各類門鎖是否故障損壞，電動門（鐵捲門）啟動時是否有警示管理	<input checked="" type="checkbox"/> 否：各類門鎖無故障損壞 <input checked="" type="checkbox"/> 是：電動門（鐵捲門）啟動時有警示管理	
7	消防設備	警報及照明設施是否正常良好	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	
8		滅火器及消防箱（栓）相關設備是否正常良好	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	
9	校舍建物外觀	是否移位、傾斜、下陷	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是（拍照存查，建議專業人員訪視處理）	
		外牆磁磚（混凝土）是否剝落或有滲漏水現象	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是（限期改善）	
10	伸縮縫或建築物間隔	寬度是否明顯改變	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是，寬度變小或碰撞，裝修材脫落（拍照存查，建議專業人員訪視處理） <input type="checkbox"/> 是，寬度變大，伸縮縫脫離（拍照存查，建議專業人員訪視處理）	
11	地下室	樑、樓版、牆壁是否有滲漏水現象	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是（限期改善）	
12	樑柱、牆壁、樓地板（含一樓地板）	是否有裂縫	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是，既有裂縫加長加寬（拍照存查並註明裂縫變化情形） <input type="checkbox"/> 是，但裂縫寬度小於 0.4 公厘（建議持續檢視） <input type="checkbox"/> 是，且裂縫寬度大於 0.4 公厘（拍照存查並註明裂縫寬度，建議專業人員訪視處理）	
		混凝土保護層是否剝落	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是，但無磚塊或鋼筋外露（建議修復） <input type="checkbox"/> 是，且有磚塊或鋼筋外露（拍照存查，建議專業人員訪視處理）	
		是否有傾斜或穿透性開裂	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是（拍照存查，建議專業人員訪視處理）	

13	屋頂	屋頂通道門是否變形	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是(限期改善)	
		屋頂防水層表面是否損壞 (如長雜草等)	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是(限期改善)	
		排水管道是否通暢	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否(限期改善)	
		女兒牆是否損壞	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是(限期改善)	
		水塔是否有裂縫	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是, 但裂縫寬度小於 0.4 公厘(建議修復) <input type="checkbox"/> 是, 且裂縫寬度大於 0.4 公厘(拍照存查並註明裂縫寬度, 建議專業人員訪視處理)	
		水塔固定設施是否鬆脫	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是(限期改善)	
14	建物 附屬 設備	室內懸吊物(如天花板、燈具、吊扇、影視設備等)之 固定設施是否鬆脫	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是(限期改善)	
		高度 1.5 公尺以上櫥櫃是 否有穩固之固定設施	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否(限期改善)	
		門窗玻璃是否變形	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是(限期改善)	
		樓梯扶手、護網與欄杆是否 牢固	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否(限期改善)	
15	其他			
檢查結果 補充說明 及建議處 置、因應 作為				

※ 本自主檢查表所定檢查項目僅供參考, 各校得視個別狀況及需求自行增刪。

※ 拍照存查者須註明拍照日期、時間及位置, 並列為本表格附件。

校舍安全檢核小組	教師兼 總務主任 洪正義	教師兼 教導主任 張雅玲	教師兼 教務主任 劉旺菁	教師兼 教務主任 邵雅慧
	教師兼附設 幼兒園主任 張玉梅	深坑國小 校長 王光宗	深坑國小 學生家長會長 黃浩楓	
承辦人:	總務主任:		校長:	
劉旺菁	洪正義		王光宗	

校園安全檢核表

學校名稱：臺南市關廟區深坑國民小學










檢核日期：112年8月23日

項次	項目	安全檢核應注意要點	查核結果	建議處置方式
1	一般事項	校舍興建、修繕時，應設置安全圍籬及警告標示以維安全	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	
2.		確實執行各項公共設施定期檢查、保養、維護	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	
4		逃生與疏散路線是否堆積雜物影響通行	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是	
5		危險物品儲放及管理是否符合安全	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	
6		電源線路開關是否有裸露及不正常使用狀況	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是	
		各類門鎖是否故障損壞，電動門（鐵捲門）啟動時是否有警示管理	<input checked="" type="checkbox"/> 否：各類門鎖無故障損壞 <input checked="" type="checkbox"/> 是：電動門（鐵捲門）啟動時有警示管理	
7	消防設備	警報及照明設施是否正常良好	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	
8		滅火器及消防箱（栓）相關設備是否正常良好	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	
9	校舍建物外觀	是否移位、傾斜、下陷	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是（拍照存查，建議專業人員訪視處理）	
		外牆磁磚（混凝土）是否剝落或有滲漏水現象	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是（限期改善）	
10	伸縮縫或建築物間隔	寬度是否明顯改變	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是，寬度變小或碰撞，裝修材脫落（拍照存查，建議專業人員訪視處理） <input type="checkbox"/> 是，寬度變大，伸縮縫脫離（拍照存查，建議專業人員訪視處理）	
11	地下室	樑、樓版、牆壁是否有滲漏水現象	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是（限期改善）	
12	樑柱、牆壁、樓地板（含一樓地板）	是否有裂縫	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是，既有裂縫加長加寬（拍照存查並註明裂縫變化情形） <input type="checkbox"/> 是，但裂縫寬度小於0.4公厘（建議持續檢視） <input type="checkbox"/> 是，且裂縫寬度大於0.4公厘（拍照存查並註明裂縫寬度，建議專業人員訪視處理）	
		混凝土保護層是否剝落	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是，但無磚塊或鋼筋外露（建議修復） <input type="checkbox"/> 是，且有磚塊或鋼筋外露（拍照存查，建議專業人員訪視處理）	
		是否有傾斜或穿透性開裂	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是（拍照存查，建議專業人員訪視處理）	

13	屋頂	屋頂通道門是否變形	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是(限期改善)	
		屋頂防水層表面是否損壞(如長雜草等)	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是(限期改善)	
		排水管道是否通暢	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否(限期改善)	
		女兒牆是否損壞	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是(限期改善)	
		水塔是否有裂縫	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是, 但裂縫寬度小於 0.4 公厘(建議修復) <input type="checkbox"/> 是, 且裂縫寬度大於 0.4 公厘(拍照存查並註明裂縫寬度, 建議專業人員訪視處理)	
		水塔固定設施是否鬆脫	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是(限期改善)	
14	建物 附屬 設備	室內懸吊物(如天花板、燈具、吊扇、影視設備等)之固定設施是否鬆脫	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是(限期改善)	
		高度 1.5 公尺以上櫥櫃是否有穩固之固定設施	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否(限期改善)	
		門窗玻璃是否變形	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是(限期改善)	
		樓梯扶手、護網與欄杆是否牢固	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否(限期改善)	
15	其他			
檢查結果 補充說明 及建議處 置、因應 作為				

※ 本自主檢查表所定檢查項目僅供參考, 各校得視個別狀況及需求自行增刪。

※ 拍照存查者須註明拍照日期、時間及位置, 並列為本表格附件。

校舍安全檢核小組					
承辦人:		總務主任:		校長:	
					

校園安全檢核表

學校名稱：臺南市關廟區深坑國民小學

檢核日期：113年2月15日

項次	項目	安全檢核應注意要點	查核結果	建議處置方式
1	一般事項	校舍興建、修繕時，應設置安全圍籬及警告標示以維安全	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	
2.		確實執行各項公共設施定期檢查、保養、維護	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	
4		逃生與疏散路線是否堆積雜物影響通行	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是	
5		危險物品儲放及管理是否符合安全	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	
6		電源線路開關是否有裸露及不正常使用狀況	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是	
		各類門鎖是否故障損壞，電動門（鐵捲門）啟動時是否有警示管理	<input checked="" type="checkbox"/> 否：各類門鎖無故障損壞 <input checked="" type="checkbox"/> 是：電動門（鐵捲門）啟動時有警示管理	
7	消防設備	警報及照明設施是否正常良好	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	
8		滅火器及消防箱（栓）相關設備是否正常良好	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	
9	校舍建物外觀	是否移位、傾斜、下陷	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是（拍照存查，建議專業人員訪視處理）	
		外牆磁磚（混凝土）是否剝落或有滲漏水現象	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是（限期改善）	
10	伸縮縫或建築物間隔	寬度是否明顯改變	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是，寬度變小或碰撞，裝修材脫落（拍照存查，建議專業人員訪視處理） <input type="checkbox"/> 是，寬度變大，伸縮縫脫離（拍照存查，建議專業人員訪視處理）	
11	地下室	樑、樓版、牆壁是否有滲漏水現象	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是（限期改善）	
12	樑柱、牆壁、樓地板（含一樓地板）	是否有裂縫	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是，既有裂縫加長加寬（拍照存查並註明裂縫變化情形） <input type="checkbox"/> 是，但裂縫寬度小於0.4公厘（建議持續檢視） <input type="checkbox"/> 是，且裂縫寬度大於0.4公厘（拍照存查並註明裂縫寬度，建議專業人員訪視處理）	
		混凝土保護層是否剝落	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是，但無磚塊或鋼筋外露（建議修復） <input type="checkbox"/> 是，且有磚塊或鋼筋外露（拍照存查，建議專業人員訪視處理）	
		是否有傾斜或穿透性開裂	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是（拍照存查，建議專業人員訪視處理）	

13	屋頂	屋頂通道門是否變形	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是(限期改善)	
		屋頂防水層表面是否損壞(如長雜草等)	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是(限期改善)	
		排水管道是否通暢	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否(限期改善)	
		女兒牆是否損壞	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是(限期改善)	
		水塔是否有裂縫	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是, 但裂縫寬度小於 0.4 公厘(建議修復) <input type="checkbox"/> 是, 且裂縫寬度大於 0.4 公厘(拍照存查並註明裂縫寬度, 建議專業人員訪視處理)	
		水塔固定設施是否鬆脫	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是(限期改善)	
14	建物 附屬 設備	室內懸吊物(如天花板、燈具、吊扇、影視設備等)之固定設施是否鬆脫	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是(限期改善)	
		高度 1.5 公尺以上櫥櫃是否有穩固之固定設施	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否(限期改善)	
		門窗玻璃是否變形	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是(限期改善)	
		樓梯扶手、護網與欄杆是否牢固	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否(限期改善)	
15	其他			
檢查結果 補充說明 及建議處 置、因應 作為				

※ 本自主檢查表所定檢查項目僅供參考，各校得視個別狀況及需求自行增刪。

※ 拍照存查者須註明拍照日期、時間及位置，並列為本表格附件。

校舍安全檢核小組	教師兼學務組長 劉旺菁	教師兼總務主任 洪正義	深坑國小黃浩楓 學生家長會會長	教師兼教學主任 張雅珍	教師兼附設幼兒園主任 林品秀
	教師兼教務組長 邵雅慧	深坑國小校長 王光宗			

承辦人：

教師兼總務主任 **洪正義**

總務主任：

教師兼總務主任 **洪正義**

校長：

深坑國小校長 **王光宗**

臺南市深坑國小 110 學年度水塔清洗紀錄表

日期	清洗狀況	清洗者	驗收者
111.02.16	清潔、無異物	長鉸水電行	教師兼 總務主任 洪正義

廚房水塔清洗前



廚房水塔清洗後



臺南市深坑國小 111 學年度水塔清洗紀錄表

日期	清洗狀況	清洗者	驗收者
112.02.02	清潔、無異物	長鉸水電行	


廚房水塔清洗前



廚房水塔清洗後




臺南市深坑國小 112 學年度水塔清洗紀錄表

日期	清洗狀況	驗收者
113.02.17	清潔、無異物	

廚房水塔清洗前



廚房水塔清洗後

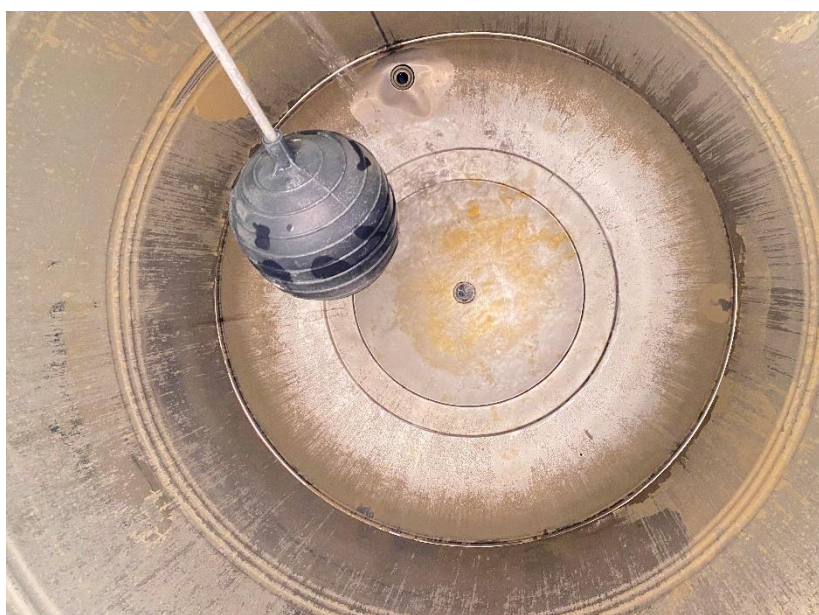

建利環保顧問股份有限公司

行政院環保署認可證字第055號

地址:高雄市前鎮區新街路286-9號7樓之1~2

電話:(07)8150815(代表號)

FAX:(07)8150816

聯絡人:吳仁杰

專案編號: GD112H01116

飲用水樣品檢驗報告

受驗單位:臺南市關廟區深坑國民小學

計畫名稱:※

採樣地點:臺南市關廟區南雄路一段487號

採樣單位:建利環保顧問股份有限公司

業別:學校

檢測目的:定期檢測

行程代碼:※

報告編號:112-02- H 01116

報告日期:112年03月02日

收樣時間:112年02月20日 17時20分

註:

1. 檢驗項目有標示“*”者,係指該檢驗項目本公司之檢驗能力已經行政院環保署認可,並依其公告之檢驗方法分析。
2. 低於方法偵測極限之測定值以“ND”表示,並註明其方法偵測極限值及單位(MDL)。
3. 本檢驗報告不得隨意複製或分離使用及作為宣傳廣告之用。
4. 本公司經環保署核可之報告簽署人如下:
無機檢測類-郭叔隆(GDI-03)、張日香(GDI-05)、許巧文(GDI-08)、李錫鈞(GDI-09)
本報告已由核可報告簽署人審核無誤,並簽署於內部報告文件。
5. 有標示“※”者,係指委託單位無提供該項資料。
6. 檢驗報告共 3 頁,分離使用無效。
7. 依據“飲用水水質標準”大腸桿菌群:最大限值:6CFU/100mL。


聲明書:

- (1) 茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定,秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實,如有違反,就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外,並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (2) 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務,亦屬於刑法上之公務員,並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定,如有違反,亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象,願受最嚴厲之法律制裁。

負責人:李建南

覆核
檢驗室主管:

郭叔隆



建利環保顧問股份有限公司

行政院環保署認可證字第055號 地址:高雄市前鎮區新街路286-9號7樓之1-2

電話:(07)8150815(代表號) FAX:(07)8150816 聯絡人:吳仁杰

專案編號: GD112H02941

飲用水樣品檢驗報告

受驗單位:臺南市關廟區深坑國民小學

計畫名稱:※

採樣地點:臺南市關廟區南雄路一段487號

採樣單位:建利環保顧問股份有限公司

業別:學校

檢測目的:定期檢測

行程代碼:※

報告編號:112-05- H 02941

報告日期:112年05月24日

收樣時間:112年05月18日 17時10分

註:

1. 檢驗項目有標示“*”者,係指該檢驗項目本公司之檢驗能力已經行政院環保署認可,並依其公告之檢驗方法分析。
2. 低於方法偵測極限之測定值以“ND”表示,並註明其方法偵測極限值及單位(MDL)。
3. 本檢驗報告不得隨意複製或分離使用及作為宣傳廣告之用。
4. 本公司經環保署核可之報告簽署人如下:
無機檢測類-郭叔隆(GDI-03)、張日香(GDI-05)、許巧文(GDI-08)、李錫均(GDI-09)
本報告已由核可報告簽署人審核無誤,並簽署於內部報告文件。
5. 有標示“※”者,係指委託單位無提供該項資料。
6. 檢驗報告共 3 頁,分離使用無效。
7. 依據“飲用水水質標準”大腸桿菌群:最大限值:6CFU/100mL。

聲明書:

- (1) 茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管相關規定,秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實,如有違反,就政府機關所受損失願身連帶賠償責任之外,並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (2) 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務,亦屬於刑法上之公務員,並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定,如有違反,亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象,願受最嚴厲之法律制裁。



負責人:李建南

覆核
檢驗室主管:

郭叔隆

建利環保顧問股份有限公司

行政院環保署認可證字第055號 地址:高雄市前鎮區新街路286-9號7樓之1-2

電話:(07)8150815(代表號) FAX:(07)8150816 聯絡人:吳仁杰

專案編號: GD112H04731

飲用水樣品檢驗報告

受驗單位:臺南市關廟區深坑國民小學
計畫名稱:※
採樣地點:臺南市關廟區南雄路一段487號
採樣單位:建利環保顧問股份有限公司
業別:學校
行程代碼:※
報告編號:112-08- H 04731
報告日期:112年08月18日
收樣時間:112年08月14日 16時30分

檢測目的:定期檢測

註:

1. 檢驗項目有標示“*”者,係指該檢驗項目本公司之檢驗能力已經行政院環保署認可,並依其公告之檢驗方法分析。
2. 低於方法偵測極限之測定值以“ND”表示,並註明其方法偵測極限值及單位(MDL)。
3. 本檢驗報告不得隨意複製或分離使用及作為宣傳廣告之用。
4. 本公司經環保署核可之報告簽署人如下:
無機檢測類-郭叔隆(GDI-03)、張日香(GDI-05)、許巧文(GDI-08)、李錫均(GDI-09)
本報告已由核可報告簽署人審核無誤,並簽署於內部報告文件。
5. 有標示“※”者,係指委託單位無提供該項資料。
6. 檢驗報告共 3 頁,分離使用無效。
7. 依據“飲用水水質標準”大腸桿菌群:最大限值:6CFU/100mL。

聲明書:

- (1) 茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定,秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實,如有違反,就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外,並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (2) 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務,亦屬於刑法上之公務員,並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定,如有違反,亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象,願受最嚴厲之法律制裁。



負責人:李建南

覆核
檢驗室主管:

郭叔隆

建利環保顧問股份有限公司

環境部許可證字號:環境部國環檢證字第055號(原環署環檢字第055號)

地址:高雄市前鎮區新街路286-9號7樓之1-2 電話:(07)8150815(代表號) FAX:(07)8150816 聯絡人:吳仁杰

專案編號: GD112H06421

飲用水樣品檢驗報告

受 驗 單 位 : 臺南市關廟區深坑國民小學
計 畫 名 稱 : ※
採 樣 地 點 : 臺南市關廟區南雄路一段487號
採 樣 單 位 : 建利環保顧問股份有限公司
業 別 : 學校 檢 測 目 的 : 定期檢測
行 程 代 碼 : ※
報 告 編 號 : 112-11- H 06421
報 告 日 期 : 112 年 11 月 06 日
收 樣 時 間 : 112 年 11 月 02 日 16 時 55 分

註 :

1. 檢驗項目有標示“*”者,係指該檢驗項目本公司之檢驗能力已經行政院環境部認可,並依其公告之檢驗方法分析。
2. 低於方法偵測極限之測定值以“ND”表示,並註明其方法偵測極限值及單位(MDL)。
3. 本檢驗報告不得隨意複製或分離使用及作為宣傳廣告之用。
4. 本公司經環境部核可之報告簽署人如下:
無機檢測類-郭叔隆(GDI-03)、張日香(GDI-05)、許巧文(GDI-08)、李錫均(GDI-09)
本報告已由核可報告簽署人審核無誤,並簽署於內部報告文件。
5. 有標示“※”者,係指委託單位無提供該項資料。
6. 檢驗報告共 3 頁,分離使用無效。
7. 依據“飲用水水質標準”大腸桿菌群:最大限值:6CFU/100mL。

聲明書:

- (1) 茲保證本報告內容完全依照行政院環境部及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定,秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實,如有違反,就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外,並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (2) 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務,亦屬於刑法上之公務員,並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定,如有違反,亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象,願受最嚴厲之法律制裁。



負責人: 李建南

覆 核
檢驗室主管:

郭叔隆

臺南市深坑國小學生參與校園美化綠化工作活動紀錄表



說明：學生參與校園植栽美化綠化活動



說明：學生參與校園植栽美化綠化活動



說明：學生參與校園植栽美化綠化活動



說明：學生參與校園植栽美化綠化活動



說明：學生參與校園植栽美化綠化活動



說明：學生參與校園植栽美化綠化活動

臺南市關廟區深坑國小教室採光測量紀錄表

測量日期：110年8月31日

測量天氣：晴

時間：上午09:00~10:30

班別	課桌部份實際照度										黑板部份實際照度										應開 燈數	燈管損 壞支數
	前左	前中	前右	中左	中央	中右	後左	後中	後右	平均	上左	上中	上右	中左	中央	中右	下左	下中	下右	平均		
一年甲班	528	547	551	722	628	571	588	602	528	585	531	531	541	537	532	512	502	510	504	522	全開	0
二年甲班	527	570	509	690	645	512	536	604	554	572	602	552	535	543	508	502	507	512	517	531	全開	0
三年甲班	521	554	514	607	602	541	625	607	512	565	523	527	538	528	518	511	503	505	503	517	全開	0
四年甲班	757	681	628	874	714	687	852	672	626	721	762	584	671	658	572	603	527	510	512	600	全開	0
五年甲班	682	652	593	928	784	638	837	715	655	720	773	621	631	757	619	585	705	547	527	641	全開	0
六年甲班	781	626	518	852	685	557	754	630	581	665	614	575	657	592	561	570	527	539	505	571	全開	0
電腦教室	528	546	571	643	570	531	549	561	527	558	535	561	570	552	535	545	516	501	505	536	全開	0
美勞教室	794	747	729	871	789	748	1260	818	727	831	624	608	545	673	529	557	678	635	566	602	全開	0
自然教室	1068	875	839	1207	957	901	1214	885	860	978	758	765	712	761	801	825	739	810	886	784	全開	0
英語教室	964	752	761	889	843	831	943	768	846	844	747	656	573	811	675	682	863	692	839	726	全開	0
音樂教室	1204	924	943	1529	968	890	1475	758	821	1057	706	707	702	740	757	834	765	761	952	769	全開	0
幼兒園	547	624	645	528	587	571	463	531	602	566	527	581	583	515	572	587	503	515	562	549	全開	2
平均標準照度	>350	>350	>350	>350	>350	>350	>350	>350	>350	>350	>500	>500	>500	>500	>500	>500	>500	>500	>500	>500	／	／

說明：

測量單位為燭光(LUX)

依據教育部公報第三0六期修正學校一般教室照明標準為：

桌面照度不低於350燭光； 黑板照度不低於500燭光(LUX)

測量及填報者：

護理師黃芳薇

總務主任：

教師兼
總務主任 洪正義

校長：

深坑國小
校長 王光宗

臺南市關廟區深坑國小教室採光測量紀錄表

測量日期：111年 02 月 08 日

測量天氣： 晴

時間：上午10:00~11:00

班別	課桌部份實際照度										黑板部份實際照度										應開 燈數	燈管損 壞支數
	前左	前中	前右	中左	中央	中右	後左	後中	後右	平均	上左	上中	上右	中左	中央	中右	下左	下中	下右	平均		
一年甲班	544	569	519	591	636	557	580	610	552	573	572	574	557	595	557	536	519	512	507	548	全開	0
二年甲班	576	578	512	597	638	547	620	598	545	579	741	620	575	654	605	547	651	524	514	603	全開	0
三年甲班	605	672	537	972	725	545	736	775	572	682	753	535	556	781	585	541	515	521	502	588	全開	0
四年甲班	686	617	573	724	691	607	783	651	614	661	657	539	649	583	535	574	517	507	528	565	全開	0
五年甲班	616	603	585	768	713	622	671	682	612	652	656	557	627	559	538	567	531	509	514	562	全開	1
六年甲班	724	671	556	770	718	575	764	727	568	675	645	585	672	584	552	592	516	523	517	576	全開	0
電腦教室	559	554	524	621	552	524	615	545	535	559	551	534	553	535	538	549	521	510	504	533	全開	0
美勞教室	748	682	622	962	673	636	923	694	627	730	527	529	539	536	554	528	528	551	515	534	全開	0
自然教室	626	646	672	938	760	697	968	756	682	749	617	673	630	622	652	643	605	607	619	630	全開	0
英語教室	899	672	634	913	731	654	1123	782	637	783	632	575	514	624	563	525	647	557	556	577	全開	1
音樂教室	923	805	717	950	765	729	974	732	624	802	614	584	525	607	587	584	561	616	602	587	全開	0
幼兒園	792	792	559	539	553	593	717	543	597	632	1273	1643	1605	1262	1542	1643	1274	1352	1574	1463	全開	1
平均標準照度	>350	>350	>350	>350	>350	>350	>350	>350	>350	>350	>500	>500	>500	>500	>500	>500	>500	>500	>500	>500	／	／

說明：

測量單位為燭光(LUX)

依據教育部公報第三0六期修正學校一般教室照明標準為：

桌面照度不低於350燭光； 黑板照度不低於500燭光(LUX)

測量及填報者： 護理師黃芳薇

總務主任： 教師兼
總務主任 洪正義

校長： 深坑國小 王光宗

臺南市關廟區深坑國小教室採光測量紀錄表

測量日期：111年 08月 26 日

測量天氣： 晴

時間：上午09:30~10:30

班別	課桌部份實際照度										黑板部份實際照度										應開 燈數	燈管損 壞支數
	前左	前中	前右	中左	中央	中右	後左	後中	後右	平均	上左	上中	上右	中左	中央	中右	下左	下中	下右	平均		
一年甲班	904	1051	881	1180	1148	984	952	1018	968	1010	1156	1284	1120	954	1230	983	926	983	807	1049	全開	0
二年甲班	894	1076	891	987	1097	926	920	1032	912	971	1082	1335	1056	970	1324	1014	917	873	848	1047	全開	0
三年甲班	921	1125	924	1203	1078	937	1051	1069	919	1025	1045	1346	1219	946	1182	1062	832	925	902	1051	全開	0
四年甲班	946	1092	967	1115	1165	1095	1072	1083	1015	1061	1054	1160	1221	923	1236	1136	776	1067	926	1055	全開	0
五年甲班	1124	1098	981	1225	1578	1160	1248	1232	1093	1193	1273	1540	1317	1178	1335	1160	973	998	915	1188	全開	0
六年甲班	932	965	831	1047	1084	927	1031	1027	930	975	1210	1491	1265	1032	1335	1112	919	848	841	1117	全開	0
電腦教室	917	1125	820	1035	1020	908	825	986	938	953	1093	1243	1098	1105	1224	1050	1070	1213	958	1117	全開	0
美勞教室	1322	1201	1030	1360	1127	989	1131	1151	962	1141	874	1893	893	812	1630	907	910	1527	863	1145	全開	0
自然教室	1083	1165	1138	1471	1272	1215	1261	1215	1134	1217	982	1983	1167	875	1765	1112	817	1620	1108	1270	全開	0
英語教室	1129	1127	1070	1519	1316	1264	1306	1290	1140	1240	1049	1933	1698	1223	1890	1188	1187	1701	1137	1445	全開	0
音樂教室	1518	1467	1436	1816	1402	1307	1590	1270	1183	1443	1160	1992	1173	1242	1852	1306	1271	1541	1390	1436	全開	0
書法教室	1084	1661	1194	1302	1071	1075	1120	1089	1040	1182	1140	1570	1349	1252	1462	1648	1632	1647	1254	1439	全開	0
幼兒園	1721	1915	1787	1283	1518	1310	1242	1302	1075	1461	1181	1490	1520	1236	1330	1379	1175	1225	1384	1324	全開	0
平均標準照度	>500	>500	>500	>500	>500	>500	>500	>500	>500	>500	>750	>750	>750	>750	>750	>750	>750	>750	>750	>750	／	／

說明：

測量單位為燭光(LUX)

依據教育部修正學校一般教室照明標準為：

桌面照度不低於500燭光； 黑板照度不低於750燭光(LUX)

測量及填報者：

護理師黃芳薇

總務主任：

教師兼
總務主任 洪正義

校長：

深坑國小
校長 王光宗

臺南市關廟區深坑國小教室採光測量紀錄表

測量日期：112年 02月 08 日

測量天氣： 晴

時間：上午10:00~11:30

班別	課桌部份實際照度										黑板部份實際照度										應開 燈數	燈管損 壞支數
	前左	前中	前右	中左	中央	中右	後左	後中	後右	平均	上左	上中	上右	中左	中央	中右	下左	下中	下右	平均		
一年甲班	894	1142	845	1473	1354	951	1130	1173	913	1097	1153	1272	937	1025	1168	892	762	1013	815	1004	全開	0
二年甲班	1036	1212	912	1132	1223	967	920	1106	930	1049	1472	1390	1076	1136	1396	1034	989	1115	829	1160	全開	0
三年甲班	953	1167	876	1671	1235	993	1238	1147	947	1136	1185	1402	975	1150	1370	946	845	986	716	1064	全開	0
四年甲班	1265	1251	1022	1264	1236	1139	1048	1118	1085	1159	1319	1357	1197	1173	1314	1078	811	1168	935	1150	全開	0
五年甲班	1364	1352	1078	1936	1842	1213	1654	1471	1113	1447	1620	1675	1327	1472	1632	1245	1036	1158	972	1349	全開	0
六年甲班	1231	1037	807	1360	1145	982	1196	1081	974	1090	1395	1426	1279	1118	1294	1061	916	1012	813	1146	全開	0
電腦教室	830	1182	838	1056	1049	823	836	997	942	950	1126	1247	1182	1180	1306	1124	998	1137	816	1124	全開	0
美勞教室	1876	1618	1230	1940	1690	1337	1651	1494	1226	1562	1212	1938	1246	1347	1948	1312	1208	1679	1202	1455	全開	0
自然教室	1741	1574	1320	1735	1578	1407	1767	1494	1246	1540	1416	1935	1382	1527	1621	1418	1225	1612	1161	1477	全開	0
英語教室	1462	1804	1376	1668	1926	1406	1687	1771	1382	1609	1792	1964	1420	1846	1917	1472	1872	1730	1485	1722	全開	0
音樂教室	1898	1644	1537	1618	1728	1560	1716	1874	1231	1645	1770	1987	1285	1814	1921	1362	1826	1632	1394	1666	全開	0
書法教室	1184	1378	1316	1621	1213	1168	1223	1183	1060	1261	1235	1819	1557	1368	1761	1762	1408	1642	1714	1585	全開	0
幼兒園	1408	1902	1545	1264	1474	1447	1261	1237	1172	1412	1360	1434	1420	1171	1445	1558	1080	1152	1423	1338	全開	0
平均標準照度	>500	>500	>500	>500	>500	>500	>500	>500	>500	>500	>750	>750	>750	>750	>750	>750	>750	>750	>750	>750	／	／

說明：
 測量單位為燭光(LUX)
 依據教育部修正學校一般教室照明標準為：
 桌面照度不低於500燭光； 黑板照度不低於750燭光(LUX)

測量及填報者：

護理師黃芳薇

總務主任：

教師兼總務主任 洪正義

校長：

校長 王光宗

臺南市關廟區深坑國小教室採光測量紀錄表

測量日期：112年 08月 02 日

測量天氣： 晴

時間：上午10:00~11:30

班別	課桌部份實際照度										黑板部份實際照度										應開 燈數	燈管損 壞支數
	前左	前中	前右	中左	中央	中右	後左	後中	後右	平均	上左	上中	上右	中左	中央	中右	下左	下中	下右	平均		
一年甲班	832	996	782	1006	1132	934	994	1061	890	959	957	1126	894	918	1142	912	754	898	778	931	全開	0
二年甲班	873	1037	876	974	1078	1046	910	1080	975	983	1262	1392	865	1140	1352	843	904	1014	761	1059	全開	0
三年甲班	868	1023	926	1146	1061	940	1020	1038	911	993	892	1305	762	793	1231	781	753	862	793	908	全開	0
四年甲班	897	1034	966	1076	1105	1307	1021	1055	1124	1065	979	1207	924	991	1196	934	756	1062	878	992	全開	0
五年甲班	1081	918	921	1524	1299	1212	1273	1187	1021	1160	1263	1534	1162	1184	1410	1190	907	1102	901	1184	全開	0
六年甲班	1022	950	835	1057	1084	948	1031	1061	991	998	1314	1432	1262	1127	1324	1024	815	946	812	1117	全開	1
電腦教室	868	1143	846	1034	1026	877	930	984	878	954	1105	1224	998	1130	1284	970	968	1150	826	1073	全開	0
美勞教室	1157	1309	1236	1368	1154	1375	1096	1244	1350	1254	1209	1853	1179	1048	1686	1243	1120	1308	1162	1312	全開	0
自然教室	1129	1178	1487	1486	1371	1350	1260	1215	1393	1319	1038	1938	1253	1042	1950	1348	987	1591	1427	1397	全開	0
英語教室	1062	1005	1156	1192	1208	1326	1047	1148	1214	1151	1340	1910	1151	1160	1824	1230	1061	1548	1175	1378	全開	0
音樂教室	1614	1526	1728	1875	1563	1845	1617	1485	1352	1623	1518	1885	1230	1561	1745	1427	1254	1567	1380	1507	全開	0
書法教室	1068	1180	1462	1536	1122	1624	1293	1192	1246	1303	1236	1428	1106	1126	1330	1424	1117	1642	1748	1351	全開	0
幼兒園	1306	1890	1760	1210	1496	1285	1098	1218	1112	1375	962	1380	1263	1038	1182	1351	918	1027	1387	1168	全開	0
平均標準照度	>500	>500	>500	>500	>500	>500	>500	>500	>500	>500	>750	>750	>750	>750	>750	>750	>750	>750	>750	>750	／	／

說明：

測量單位為燭光(LUX)

依據教育部修正學校一般教室照明標準為：

桌面照度不低於500燭光； 黑板照度不低於750燭光(LUX)

測量及填報者：

護理師黃芳薇

總務主任：

教師兼
總務主任 洪正義

校長：

深坑國小
校長 王光宗

臺南市關廟區深坑國小教室採光測量紀錄表

測量日期：113年 01月 24 日

測量天氣： 晴

時間：上午10:00~11:30

班別	課桌部份實際照度										黑板部份實際照度										應開 燈數	燈管損 壞支數
	前左	前中	前右	中左	中央	中右	後左	後中	後右	平均	上左	上中	上右	中左	中央	中右	下左	下中	下右	平均		
一年甲班	1027	1158	958	1909	1416	1096	1382	1305	1121	1264	1314	1421	834	1120	1329	890	859	971	752	1054	全開	0
二年甲班	1015	1142	892	1043	1148	984	1032	1105	1001	1040	1093	1412	812	997	1307	791	863	907	753	993	全開	0
三年甲班	934	964	815	1572	1145	880	1143	1115	903	1052	1064	1365	759	954	1422	753	790	1081	761	994	全開	0
四年甲班	1287	1182	1156	1590	1324	1317	1274	1236	1258	1292	1306	1276	898	1051	1264	949	856	996	782	1042	全開	0
五年甲班	1212	1461	1167	1608	1910	1446	1743	1731	1534	1535	1540	1610	1182	1436	1527	1172	1566	1143	843	1335	全開	0
六年甲班	1642	1256	935	1462	1328	1045	1365	1201	1028	1251	1353	1505	957	1270	1407	836	934	943	753	1106	全開	1
電腦教室	999	1253	989	1152	1124	876	1106	1093	1025	1069	1253	1327	1121	1141	1341	1086	1065	1135	936	1156	全開	0
美勞教室	1816	1466	1267	1563	1416	1301	1426	1546	1286	1454	1169	1543	897	1280	1684	1040	1062	1428	952	1228	全開	0
自然教室	1456	1446	1367	1951	1592	1466	1624	1438	1405	1527	1450	1851	1146	1506	1648	1357	1525	1676	1386	1505	全開	1
英語教室	1812	1536	1405	1582	1664	1460	1748	1771	1507	1609	1667	1862	1129	1735	1967	1341	1584	1483	1467	1582	全開	0
音樂教室	1674	1709	1477	1894	1816	1489	1572	1602	1332	1618	1520	1984	1176	1667	1958	1361	1556	1381	1426	1559	全開	0
書法教室	1352	1282	1140	1744	1418	1395	1558	1430	1163	1387	1481	1834	1508	1420	1565	1574	1423	1822	1767	1599	全開	0
幼兒園	1532	1871	1643	1032	1464	1287	1178	1309	1136	1384	1215	1487	1657	1231	1486	1562	1002	1216	1398	1362	全開	0
平均標準照度	>500	>500	>500	>500	>500	>500	>500	>500	>500	>500	>750	>750	>750	>750	>750	>750	>750	>750	>750	>750	／	／

說明：

測量單位為燭光(LUX)

依據教育部修正學校一般教室照明標準為：

桌面照度不低於500燭光； 黑板照度不低於750燭光(LUX)

測量及填報者：

護理師黃芳薇

總務主任：

教師兼
總務主任 洪正義

校長：

深坑國小
校長 王光宗

臺南市深坑國小校園無菸無毒環境營造紀錄表



說明：校門口前懸掛全面禁菸布條



說明：校門口前附近設立無菸通學步道



說明：校園設立拒菸大型看板宣導



說明：辦理菸害防制繪畫比賽



說明：邀請衛生所及中華醫大宣講菸檯防制



說明：邀請衛生所及中華醫大宣講菸檯防制
